Приложение №1

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Октябрьский район города Ростова-на-Дону;
2. Наименование инициативного проекта: Губернаторский проект поддержки местных инициатив «Сделаем вместе»;
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 06.04.2026 по 01.10.2026;
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае, если такой срок нарушен: отсутствует.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 01.10.2026.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1.	Благоустройство пешеходной зоны вдоль реки Темерник по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8	1426533,36	ИП Пакриева О.О.
	Итого		

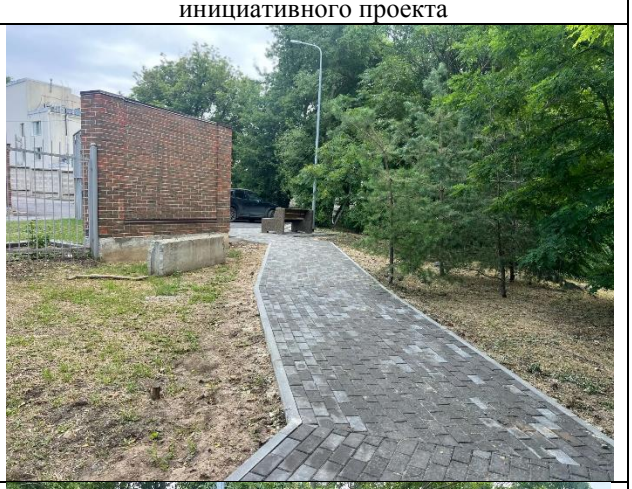
*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	1500,1	100	1426,5	100
объем средств областного бюджета	-	-	-	-
объем собственных средств местного бюджета	1323,9	88,3	1259,0	88,3
объем инициативных платежей физических лиц				

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	176,2	11,7	167,5	11,7
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Экономия по факту выполненных работ			

5. Фотоматериалы*

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.		
2.		

3.		
