Приложение №1

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Железнодорожный район города Ростова-на-Дону;
2. Наименование инициативного проекта: Губернаторский проект поддержки местных инициатив «Сделаем вместе»;
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.04.2026 по 30.04.2026.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае, если такой срок нарушен: отсутствует.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 30.04.2026.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1.	Установка скамеек и урн, расположенных на территории пл. Привокзальная, тротуар между главным и пригородным ЖД вокзалами	599600,00	ИП Воропаева Л.С.
	Итого		

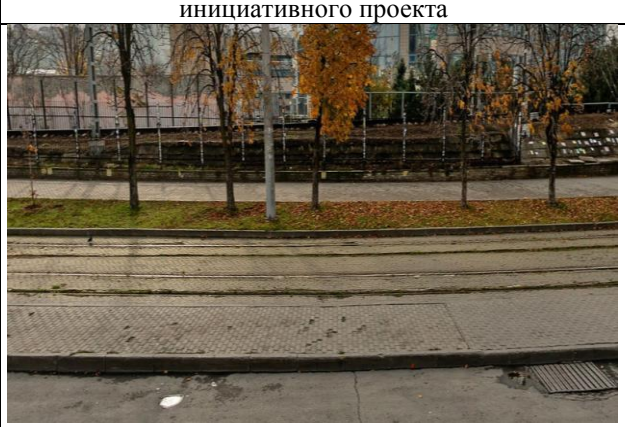
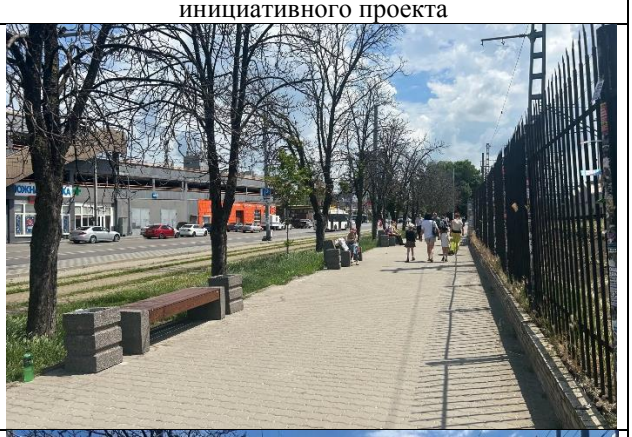
*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	599,7	100	599,6	
объем средств областного бюджета	-	-	-	-
объем собственных средств местного бюджета	569,7	95	569,62	95

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	30,0	5	29,98	5
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы*

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.		
2.		
